PEAB

FÖRSLAG HUVUDTIDPLAN

Rad	Beskrivning
1	**Om-och tillbyggnad flygelbyggnad**
2	**Rivning - sammansatta**
3	Rivning av väggar och bjälklag
4	Demontering
5	Håltagning, förstärkning
6	**Efterlagningar**
7	Puts&lapp efter rivningar
8	**Grundkonstruktioner**
9	Grundsula i trapphus
10	Schakt hissgrop
11	Hissgrop
12	Platta på mark
13	**STOMME**
14	Smidesarvväxklingar
15	**Undergolv**
16	Avjämningsmassa
17	**Innerväggar**
18	Gipsväggar
19	**Inv. dörrar, Glaspartier**
20	Montage dörrar och partier
21	**Inv. trappor**
22	Montage trappa
23	**Ytskikt golv och trappor**
24	Plastmatta
25	**Ytskikt vägg**
26	**Ytskikt tak, Undertak**
27	Undertaksmontage
28	**Skåp och inredningssnickerier**
29	Montage snickerier
30	**Rumskomplettering övrigt**
31	Beslagning mm
32	**Hiss inv**
33	**Städning**
34	Slutstäd
35	**Kyla, Luft**
36	**El**
37	**Transport, Hiss**
38	**Sanitet, Värme**
41	**Nybyggnad kyrka**
42	**Grundkonstruktioner**
43	Pålplattor
44	Grundbalkar
45	**Platta på mark**
46	Platta på mark källare
47	Värmegolv
48	Platta &valv entréplan
49	Gjutning & Slipning av btg.golv(värmesling)
50	**Väggar**
51	Väggar källare
52	Låga väggar under balkong Västra
53	Låga väggar under balkong Norra
54	Höga väggar Östra
55	Höga väggar Södra
56	Väggar på balkong Västra
57	Väggar på balkong Norra
58	Väggar Mandorla
59	**Skalväggar**
60	Skalväggar Mandorla
61	Skalväggar Väster
62	Skalväggar Norr
63	Skalväggar Öster
64	Skalväggar Söder
65	**Bjälklag, Balkar**
66	Valv balkong
67	Balkbottnar fönster
68	Valv samt stålbalk
69	Valv gjutning
70	Rivning Valvform
71	Takvalv
72	Takvalv gjutning
73	Rivning Takvalvform
74	Skärmtak
75	**Tätskikt**
76	Tätskikt lågadelen
77	Tätskikt högadelen
78	**Övergolv**
79	Värmeslingor
80	Gjutning/slipning
81	**Yttertak - sammansatta**
82	Yttertak komplett
83	**Stomkompl., Utfackning**
84	Kompletering diverse
85	**Fönster, Dörrar, Partier, Portar**
86	Fönster och glaspartier av aluminium
87	**Inv. dörrar, Glaspartier**
88	Montage dörrar & partier
89	**Inv. trappor**
90	Montage ståltrappa
91	**Komplettering stomme / rumsbildning**
92	U-tak
93	Brandlucka takbjl
94	Brandgardin
95	**Skåp och inredningssnickerier**
96	diverse snickerier
97	**Sanitet, Värme**
98	**El**
99	**Styr**
100	**Samordnad provning**
101	**Slutstädning**
102	**Slutbesiktning**

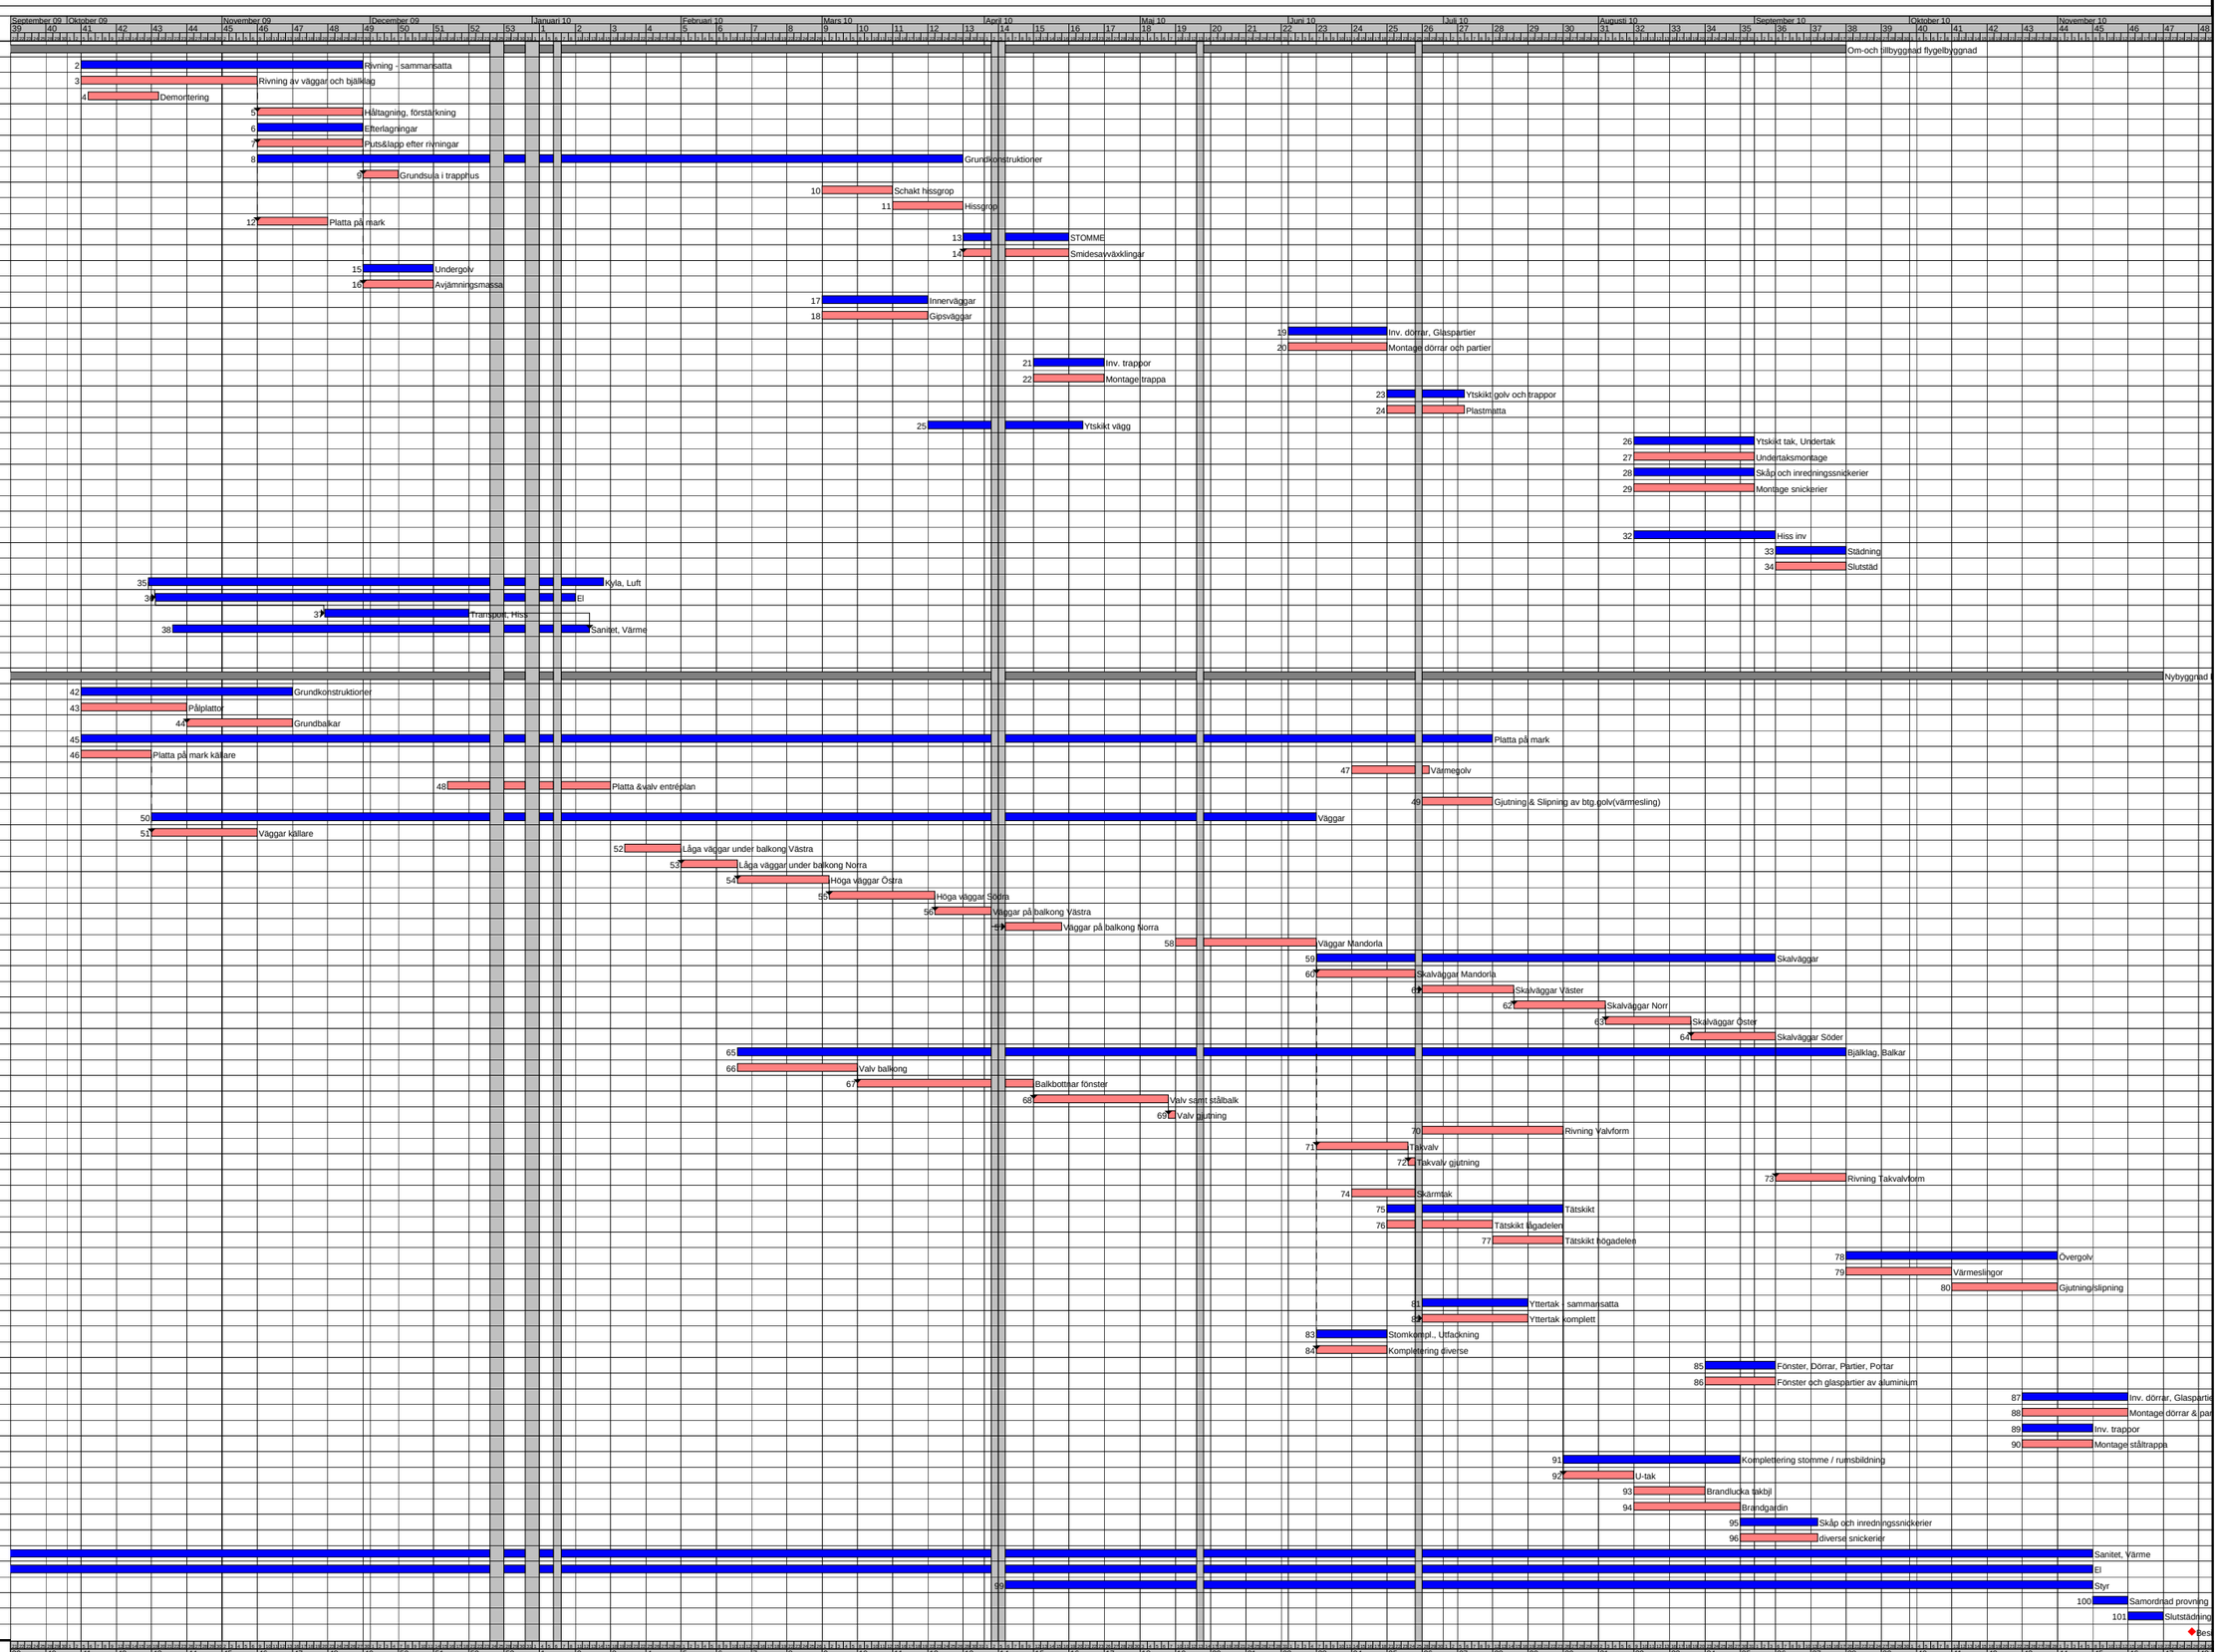

Upprättad av:J Fäldt
Granskas av:B Berglin

Datum:2009-06-29
Rev:2010-03-03

Projektstyr.B.Tidplan 07-03-27

PlanCon 6.2

Peab Sverige AB
